




COMUNE DI LASTRA A SIGNA

(Città Metropolitana di Firenze)

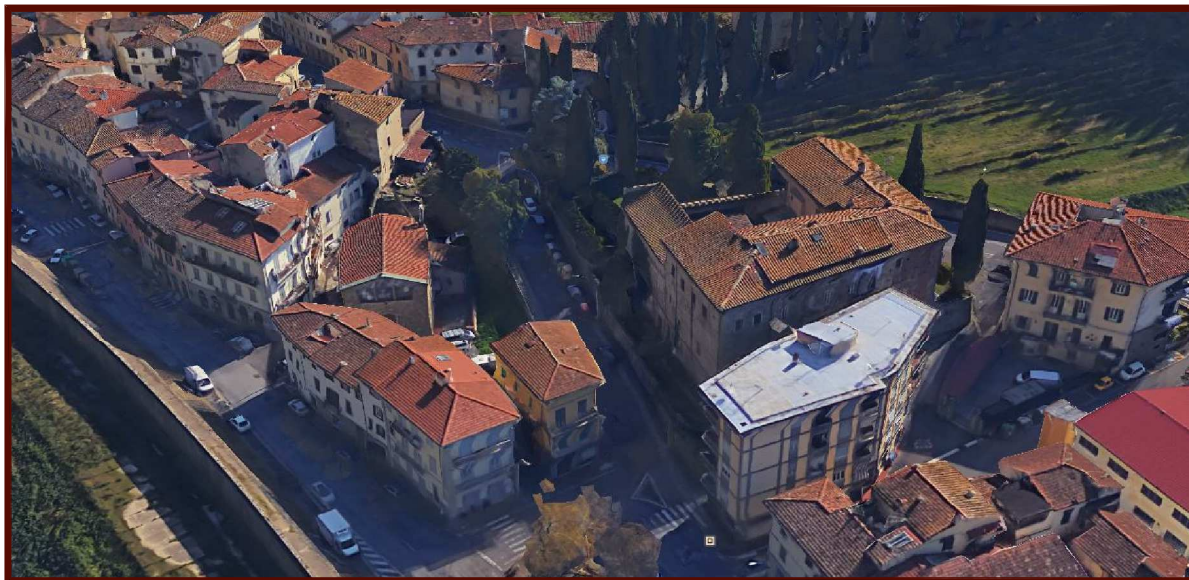

PROGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARTIRI DEL POPOLO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

LA PROPRIETA'

Responsabile Settore 4
Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici
Geom. Luca BETTI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Luca BETTI

PROGETTAZIONE - Ufficio Lavori Pubblici

Arch. Angelo DI SALVO

rev. 0 - Ottobre 2017

ELABORATO



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
CANTIERE FISSO VIA PIER CAPPONI				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	15/03/2018	15/03/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	15/03/2018	15/03/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	15/03/2018	15/03/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	15/03/2018	15/03/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	16/03/2018	16/03/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	16/03/2018	16/03/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	16/03/2018	16/03/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	13/04/2018	13/04/2018
CANTIERE MOBILE - MARTIRI DEL POPOLO				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	19/03/2018	19/03/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	19/03/2018	19/03/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2	2	19/03/2018	20/03/2018
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	1	21/03/2018	21/03/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	22/03/2018	22/03/2018
Demolizione di fondazione stradale	1	1	23/03/2018	23/03/2018
Scavo a sezione ristretta	2	2	26/03/2018	27/03/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	1	28/03/2018	28/03/2018
Posa di cavidotto in materie plastiche	1	1	29/03/2018	29/03/2018
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	1	30/03/2018	30/03/2018
Formazione di fondazione stradale	1	1	03/04/2018	03/04/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2	2	03/04/2018	04/04/2018
Realizzazione di marciapiedi	2	2	05/04/2018	06/04/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	2	2	09/04/2018	10/04/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	26/03/2018	26/03/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	27/03/2018	27/03/2018
Verniciatura a pennello di opere in ferro	2	2	05/04/2018	06/04/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	11/04/2018	11/04/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	11/04/2018	11/04/2018
Posa di segnaletica verticale	1	1	12/04/2018	12/04/2018
Pulizia di sede stradale	1	1	12/04/2018	12/04/2018
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	13/04/2018	13/04/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	13/04/2018	13/04/2018

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]
